ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1	Prosjektstart	0 dager	ma 3/10/08	ma 3/10/08	
2	Definering av oppgave	10 dager	ma 3/10/08	fr 3/21/08	1
3	Opprettelse av hjemmeside	2 dager	ma 3/24/08	ti 3/25/08	2
4	Utarbeiding av forprosjektrapport	5 dager	ti 3/25/08	ma 3/31/08	2
5	Forprosjektrapport leveres	0 dager	ma 3/31/08	ma 3/31/08	4
6	Oppstart Working Document og utlysning av hjemmeside	0 dager	ti 4/1/08	ti 4/1/08	5
7	Uttesting av AUTO102	7 dager	ti 4/1/08	on 4/9/08	6
8	Uttesting av ELM327	7 dager	ti 4/1/08	on 4/9/08	5
9	Valg av teknologi	0 dager	on 4/9/08	on 4/9/08	8,7
10	Utvikling av lokalt grensesnitt	21 dager	to 4/10/08	to 5/8/08	9
11	Lokalt grensesnitt ferdig	0 dager	to 5/8/08	to 5/8/08	10
12	Midtveisrapport leveres	0 dager	fr 5/9/08	fr 5/9/08	6
13	Trådløs teknologi velges	3 dager	fr 5/9/08	ti 5/13/08	11
14	Tilpasse lokalt grensesnitt til trådløs kommunikasjon	10 dager	on 5/14/08	ti 5/27/08	13
15	Ferdigstillt prototype	0 dager	ti 5/27/08	ti 5/27/08	14
16	Ferdigstille prosjektrapport	4 dager	on 5/28/08	ma 6/2/08	15
17	Prosjekt ferdig	0 dager	ma 6/2/08	ma 6/2/08	16
18	Forberede Expo og presentasjon	2 dager	ti 6/3/08	on 6/4/08	17
19	Expo	3 dager	on 6/4/08	fr 6/6/08	
20	Avsluttet hovedprosjekt	0 dager	fr 6/6/08	fr 6/6/08	19

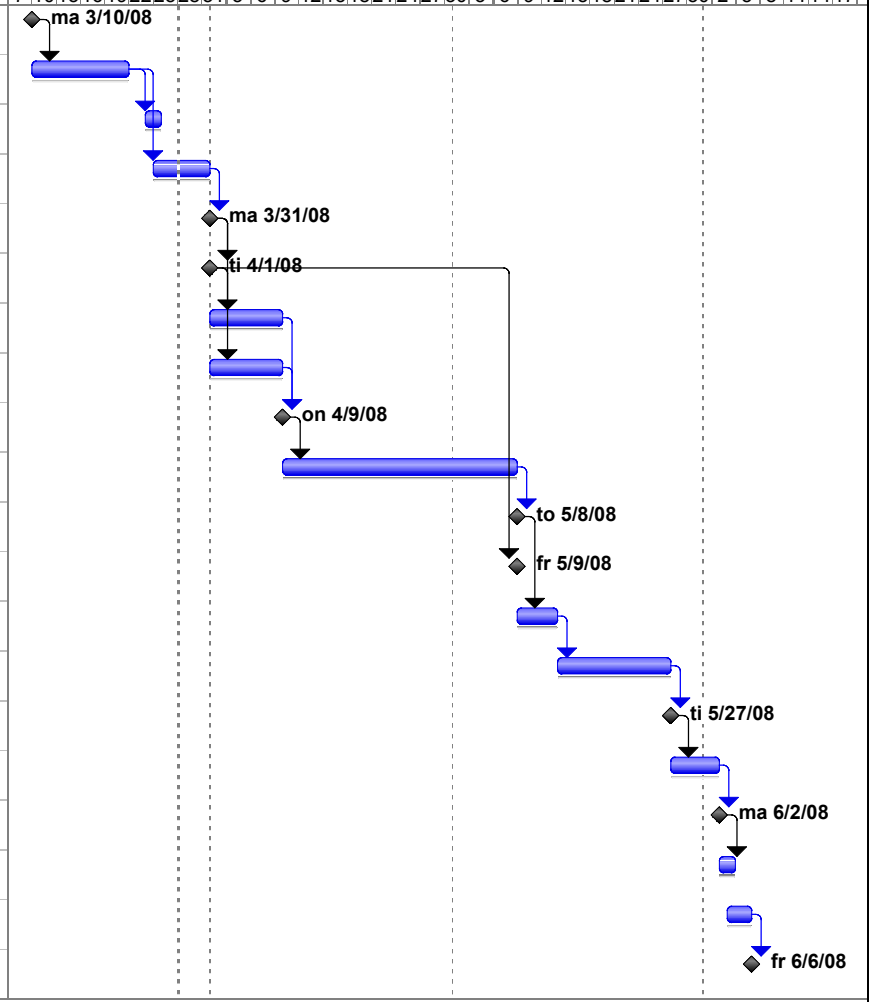

Prosjekt: Prosjektplan - Hovedprosjekt
Dato: fr 3/28/08

Aktivitet	Milepæl	Eksterne aktiviteter	
Deling	Sammendrag	Ekstern milepæl	
Fremdrift	Prosjektsammendrag	Tidsfrist	
